事例No.	1540
公表年度	R3
団体の属性	指定都市
団体名	神奈川県相模原市

事例区分	DX

タグ	・ICT ・EBPM ・（行政改革）業務の効率化

事例種類	自治体DX推進

事例内容・タイトル

ICT総合戦略の進行管理

出典

自治体DX推進手順書参考事例集

事例：ICT総合戦略の進行管理【神奈川県相模原市】

Point

- 戦略見直しのサイクルを設定することで、定期的に最適な進め方に見直す
- 戦略の進行管理を行い、作りっぱなしではない生きた計画に


概要

○　事業ごとにICT総合戦略見直しのサイクルを設定することで、計画段階で想定した事業の進め方に固執するのではなく、適宜、最適な進め方に見直すなど、より良い成果に向けて柔軟な取組みを重視。

○　戦略の推進に関する事項を審議するために、庁内にＩＣＴ戦略調整会議を設置し、毎年度計画全体の進捗状況を客観的に評価する。

○　事業ごとにPDCAサイクルを回す際に、事業の実施主体のみならず、ICT戦略調整会議において事業の進捗状況を評価（Check）し、進行管理を行う。

＜ 進行管理のイメージ ＞（相模原市ICT総合戦略より）

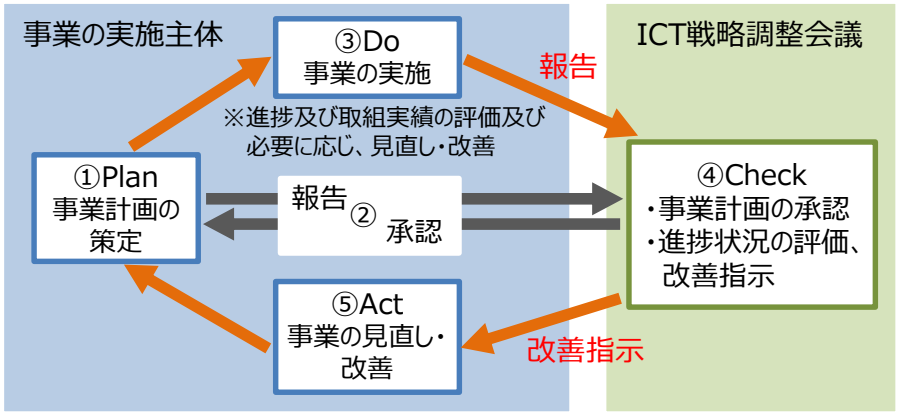

＜ 計画の見直しの**考え方** ＞

計画段階で想定した事業の進め方(ＩＣＴの活用方法、行動目標等)に固執するのではなく、適宜、最適な進め方に見直す等、「成果」に向けた柔軟な取組を重視する。計画策定段階で設定した管理指標に縛られた結果、取組が形骸化する等、事業の進捗のみに意識を向けることがないよう、柔軟に計画を見直していく。

＜ 計画の見直しの**進め方** ＞

行動目標や成果指標の見直し、事業の新規追加や削除等、計画の見直しは、事業の実施主体が見直しの必要性や見直し案の検討を行い、事務局と見直しの妥当性について協議の上、調整会議に諮り、見直しの可否を決定する。

なお、計画見直しのサイクルは、次のとおり。

・重点事業：半年単位　・重点以外の事業：１年単位

【参考情報】 人口：71.8万人、 関連URL：https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/joho_suishin/1004398.html

類似の取組を行っている団体：神奈川県秦野市、岐阜県関市、大阪府四條畷市
